

ARAMIREZ-AI

Planificación del Sprint 8

Equipo Plataforma · 29 de Junio al 12 de Julio de 2026

OBJETIVOS

Objetivos del Sprint

Metas del Sprint

- **Completar todos los endpoints de la API REST v2 (6 endpoints pendientes)**
- **Integrar el dashboard de administración con la API v2**
- **Alcanzar el 85% de cobertura de pruebas automatizadas**
- **Resolver las 3 deudas técnicas priorizadas en la retrospectiva anterior**
- **Preparar el entorno de staging para pruebas de aceptación con el cliente**

Capacidad del Equipo

Distribución de días-hombre disponibles

ARAMIREZ-AI

Frontend

2 desarrolladores

- Ana: 10 días
- Carlos: 10 días
- Total: 20 días-hombre

Backend

2 desarrolladores

- María: 10 días
- Luis: 8 días (1 día off)
- Total: 18 días-hombre

QA

1 desarrollador

- Sofía: 10 días
- Total: 10 días-hombre

DevOps


1 desarrollador

- Pedro: 5 días (soporte parcial)
- Total: 5 días-hombre

Backlog Priorizado

Prioridad	Historia de Usuario	Puntos	Responsable	Estado
Crítica	Endpoint GET /api/v2/usuarios con paginación y filtros	5	Backend	 En curso
Alta	Dashboard de usuarios conectados en tiempo real	8	Frontend	 Por iniciar
Alta	Endpoint POST /api/v2/usuarios con validación	3	Backend	 Por iniciar
Media	Implementar rate limiting por API key	3	Backend	 Por iniciar
Media	Pruebas de integración para módulo de usuarios	5	QA	 Por iniciar
Baja	Documentación Swagger para endpoints v2	2	Backend	 Por iniciar
Baja	Corregir vulnerabilidad CSRF en formularios	2	Frontend	 Por iniciar

Capacidad por Área (días-hombre)

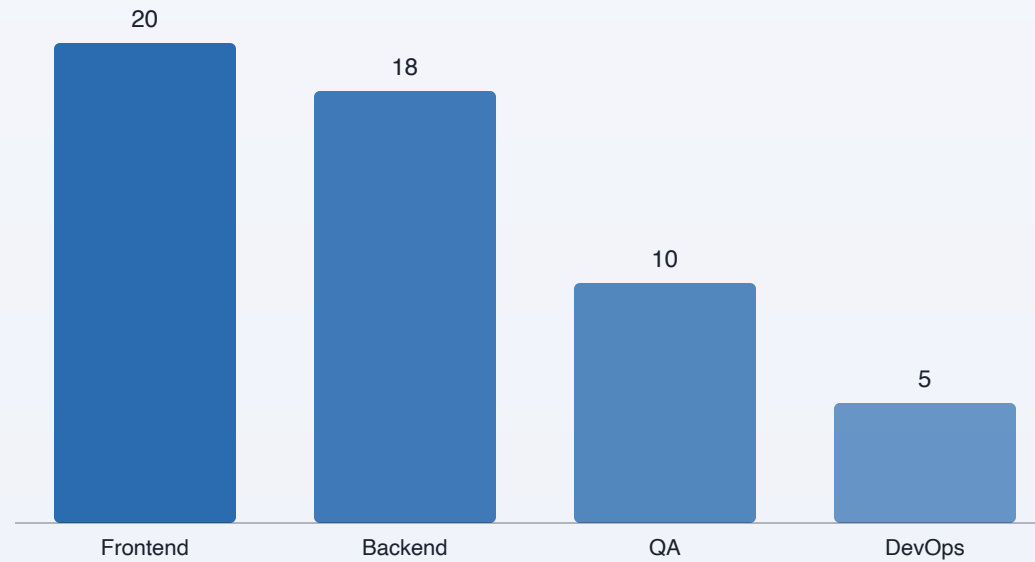

Riesgos Identificados

- Dependencia del equipo de seguridad para revisión de autenticación
- Vacaciones de Luis reduce capacidad de backend en 2 días
- Posible cambio de alcance solicitado por el cliente
- Integración con sistema legacy puede requerir más tiempo del estimado

Plan de Mitigación

- Solicitar revisión de seguridad al inicio del sprint
- Reasignar tarea de autenticación a María
- Congelar alcance aprobado por el Product Owner
- Reservar 2 días de buffer para integración legacy

28

Story Points Comprometidos

Capacidad total estimada del equipo para el Sprint 8

Flujo de Trabajo del Sprint

ARAMIREZ-AI

